

# Trappplan

## Lagring och transport

Lagra planer på jämn upplagsplats med max 5 st. i varje stuv. Underslagen placeras i lod ovanför varandra så nära lyftpunkterna som möjligt.

Se fig. 71.

För lyft användes en lyftgrimma med 4 kättingar. Den kopplas i ingjutna lyftwirar eller i skruvfästen. Träregel placeras mellan lyft och plan för att skydda plankanten.

OBS! Planen får ej lyftas i utstickande byglar eller liknande.

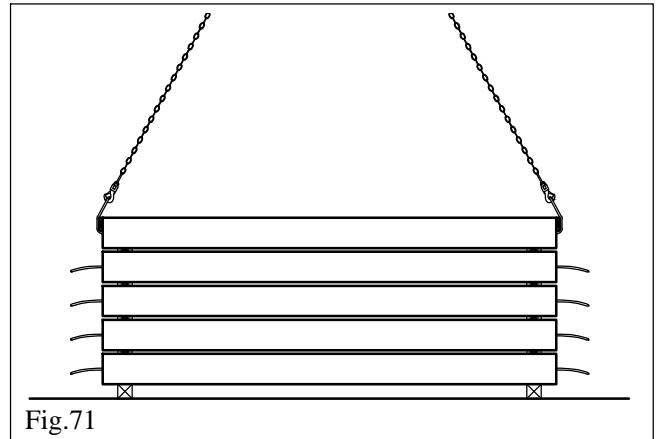


Fig.71

## Montering

Trappplan inpassas i rätt läge genom pallning med brickor vid upplagen och med distansklossar som sätts mellan plan och vägg. I de fall där planet är upplagt på dubbar, stämpas planet från underliggande plan. Stämpan ställs i lod ovanför varandra och diagonalsträvas.

Utförande och tillvägagångssätt för klack- och dubbupplag enligt arbetsritning. Pallning placeras 10mm från väggliv.

Klack- och dubbupplag igjutes med cementbruk C20/25. Se fig. 72 och 73.

Anslutande trappor monteras enligt särskilda montageanvisningar.

Först när i- och kringgjutningar uppnått erforderlig hållfasthet får stämpan tas bort och trappplanen användas.

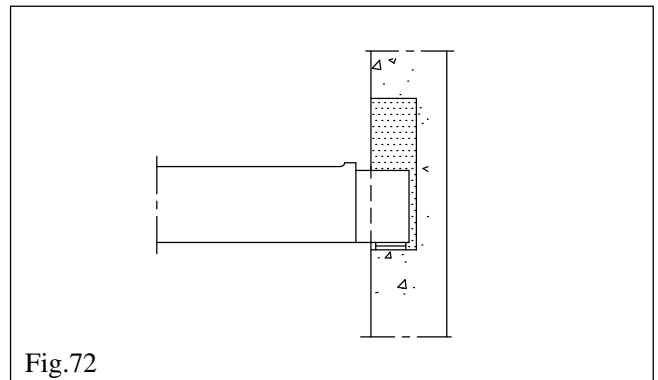


Fig.72

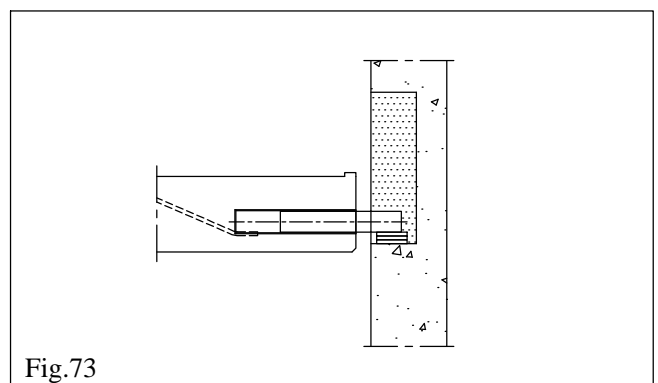


Fig.73
